BMC URUGUAY

Panelin · resumen visual de obra

Techo + Fachada
bmcuruguay.com.uy · 092 663 245

Cliente: Constructora Sol del Este S.A. · **Obra:** Galpón de almacenamiento — Maldonado · **Ref:** BMC-2026-0427-01

Planta 2D · cubierta — anotada

Vista esquemática · ISO 129 · cotas en milímetros

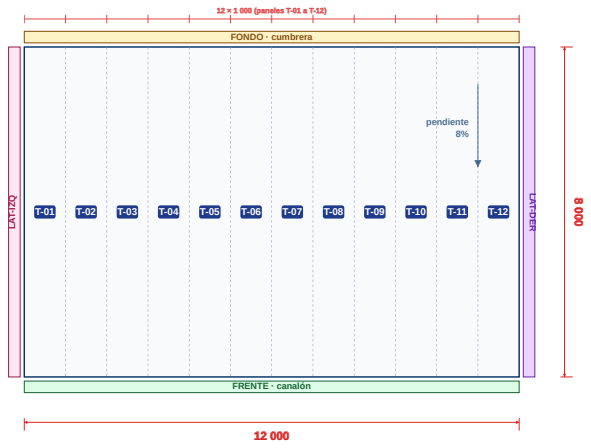

- T-01..T-12 · paneles techo
- FONDO · cumbrera
- FRENTE · canalón
- LAT-IZQ · cierre lateral
- LAT-DER · cierre lateral
- FIX · fijación / sellado

ÁREA PANELES	PANELES	APOYOS	PTS. FIJACIÓN
96.0 m²	12	4	96

Resumen de partidas (identificadas en el plano)

▸ **Paneles ISODEC PIR 50mm**		
T-01..T-12	Panel ISODEC PIR 50mm · Blanco · 1.0 × 8.0 m · 12 unid.	**$3,720.00**
▸ **Bordes y cierres**		
FONDO	Cumbrera articulada · 12.0 m	**$222.00**
FRENTE	Canalón rectangular 200mm · 12.0 m	**$270.00**
LAT-IZQ	Cierre lateral · 8.0 m	**$75.00**
LAT-DER	Cierre lateral · 8.0 m	**$75.00**
▸ **Fijación y accesorios**		
FIX	Tornillo autoperforante 6.3 × 80 · 96 u	**$115.20**
FIX	Sellador silicona neutra 280 ml · 8 u	**$76.80**

Subtotal s/IVA USD 4,554.00 · **IVA 22%** USD 1,001.88

TOTAL USD
$5,555.88

Vista esquemática para obra (no escala de plano). Los códigos T-01..T-12 y los nombres de borde (FONDO/FRENTE/LAT-IZQ/LAT-DER) referencian las posiciones del plano técnico anotado de arriba con las filas del resumen de partidas. Propuesta comercial BMC Uruguay.
